


ID		Task Mode	Task Name	Duration	Start	Finish	Predecessors	Qtr 2 May Jun 2024 Qtr 3 Jul Aug Sep 2024 Qtr 4 Oct Nov Dec											
1			KTU4U programėlės integracija	270 days	Tue 24-06-04	Mon 25-06-16													
2			1. Programėlės koncepto	14 days	Tue 24-06-04	Fri 24-06-21													
3			1.1. Minčių šturmo sesija	10 days	Mon 24-06-24	Fri 24-07-05	2												
4			1.1.1. Suorganizuoti minčių šturmo sesiją.	8 days	Mon 24-07-08	Wed 24-07-17	3												
5			1.1.2. Surinkti idėjas ir pasiūlymus iš komandos narių, kategorizuoti, prioritetizuoti ir	2 days	Thu 24-07-18	Fri 24-07-19	4												
6			1.2. Konsultacija su dizaineriu ir programuotoju	9 days	Mon 24-07-22	Thu 24-08-01													
7			1.2.1. Susitikimas su programuotoju dėl dizaino ir techninių galimybių	1 day	Mon 24-07-22	Mon 24-07-22	5												
8			1.3. Funkcionalumų aprašymas	4 days	Tue 24-07-23	Fri 24-07-26	7												

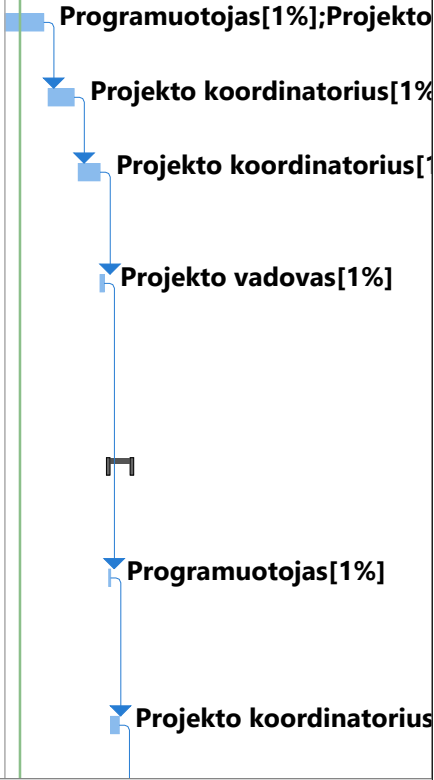

Project: Projekto lentelė
Date: Tue 24-06-11

Task

Split

Milestone

Summary

Project Summary

Inactive Task

Inactive Milestone

Inactive Summary

Manual Task

Duration-only

Manual Summary Rollup

Manual Summary

Start-only

Finish-only

External Tasks

External Milestone

Deadline

Progress

Manual Progress

ID		Task Mode	Task Name	Duration	Start	Finish	Predecessors	Qtr 2		2024 Qtr 3			2024 Qtr 4		
								May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec
9			1.3.1. Nustatyti pagrindinius funkcionalumus, juos detaliai aprašyti funkcionalumus,	4 days	Mon 24-07-29	Thu 24-08-01	8					Projekto vadovas[1%]			
10			2. Atnaujinti ir paleisti	81 days	Fri 24-08-02	Fri 24-11-22	9								
11			2.1. Susitikimai su KTU4Students programėlės savininkais	5 days	Fri 24-08-02	Thu 24-08-08									
12			2.1.1. Aptarti esamą programėlės būklę bei norimus pokyčius, parengti bendradarbiavimo	5 days	Fri 24-08-09	Thu 24-08-15	11								
13			2.2. Programavimas	40 days	Fri 24-08-16	Thu 24-10-10	12								
14			2.2.1. Atnaujinti esamą kodą	21 days	Fri 24-10-11	Fri 24-11-08	13								
15			2.2.2. Pataisyti klaidas pagal testavimo	5 days	Mon 24-11-11	Fri 24-11-15	14								
16			2.2.3. Pataisyti klaidas pagal vartotojų testavimo	5 days	Mon 24-11-18	Fri 24-11-22	15								

Project: Projekto lentelė
Date: Tue 24-06-11

Task

Split

Milestone

Summary

Project Summary

Inactive Task

Inactive Milestone

Inactive Summary

Manual Task

Duration-only

Manual Summary Rollup

Manual Summary

Start-only

Finish-only

External Tasks


External Milestone

Deadline


Progress

Manual Progress

Page 2

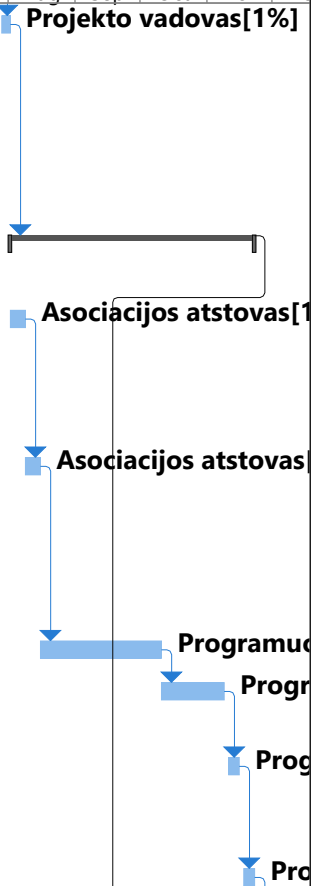

ID		Task Mode	Task Name	Duration	Start	Finish	Predecessors	Qtr 2 May	Jun	2024 Qtr 3 Jul	Aug	Sep	2024 Qtr 4 Oct	Nov	Dec
28			3. Įgyvendinti viešinimo kampaniją	20 days	Fri 24-09-27	Fri 24-10-25									
29			3.1. Kampanijos plano parengimas	10 days	Fri 24-09-27	Fri 24-10-11	10FS-50%								
30			3.1.1. Nustatyti tikslinę auditoriją ir komunikacijos	5 days	Fri 24-10-11	Fri 24-10-18	29								
31			3.1.2. Parengti viešinimo strategiją	5 days	Fri 24-10-18	Fri 24-10-25	30								
32			3.2. Kampanijos medžiagos	40 days	Fri 24-10-25	Fri 24-12-20									
33			3.2.1. Kurti reklaminį turinį	5 days	Fri 24-10-25	Fri 24-11-01	31								
34			3.2.2. Parengti tekstus pranešimams	15 days	Fri 24-11-01	Fri 24-11-22	33								
35			3.2.3. Kurti reklamos dizainą ir grafinius elementus	20 days	Fri 24-11-22	Fri 24-12-20	34								
36			3.3. Kampanijos vykdymas	75 days	Fri 24-11-22	Fri 25-03-07									
37			3.3.1. Paleisti reklaminę kampaniją	20 days	Fri 24-12-20	Fri 25-01-17	35								



Project: Projekto lentelė
Date: Tue 24-06-11

Task

Split


Milestone

Summary

Project Summary

Inactive Task

Inactive Milestone















Inactive Summary

Manual Task

Duration-only

Manual Summary Rollup

Manual Summary

Start-only

Finish-only
















External Tasks

External Milestone

Deadline

Progress

Manual Progress











ID		Task Mode	Task Name	Duration	Start	Finish	Predecessors	Qtr 2 May	Jun	2024 Qtr 3 Jul	Aug	Sep	2024 Qtr 4 Oct	Nov	De
38			3.3.2. Patalpinti straipsnius prieinamuose kanaluose, po vieną	20 days	Fri 25-01-17	Fri 25-02-14	37								
39			3.4. Kampanijos stebėjimas	50 days	Fri 24-11-22	Fri 25-01-31	34								
40			3.4.1. Stebėti kampanijos efektyvumą	20 days	Fri 25-01-31	Fri 25-02-28	39								
41			3.4.2. Parengti galutinę kampanijos ataskaitą su	5 days	Fri 25-02-28	Fri 25-03-07	40								



Project: Projekto lentelė
Date: Tue 24-06-11

Task

Split


Milestone

Summary

Project Summary

Inactive Task

Inactive Milestone















Inactive Summary

Manual Task

Duration-only

Manual Summary Rollup

Manual Summary

Start-only

Finish-only
















External Tasks

External Milestone

Deadline

Progress

Manual Progress











		2025 Qtr 1			2025 Qtr 2			2025 Qtr 3			2025 Qtr 4			2026 Qtr 1			2026 Qtr 2			2026 Qtr 3			2026 Qtr 4			2027 Qtr 1			2027 Qtr 2		
Dec	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar	Apr	May		
Task Split Milestone Summary Project Summary Inactive Task Inactive Milestone																															
External Tasks External Milestone Deadline Progress Manual Progress																															
Project: Projekto lentelė Date: Tue 24-06-11																															
Page 7																															



